




# 神通川・五福護岸その2工事 説明資料

朝日建設株式会社

工事名	神通川・五福護岸その2工事
発注者名	国土交通省 北陸地方整備局 富山県河川国道事務所
受注者名	朝日建設株式会社
工期	令和4年6月1日～令和5年2月28日まで
事業の概要 及び 整備効果	当該箇所（工事箇所①）は、河床が低くなってきており、洪水が発生した場合に、堤防が危険な状態になることを防止するため、低水路に新しく護岸及び根固工を施工することにより、治水安全度を向上させる目的の事業です。工事箇所②は多自然型護岸工の「かごマット工」のみとなります。

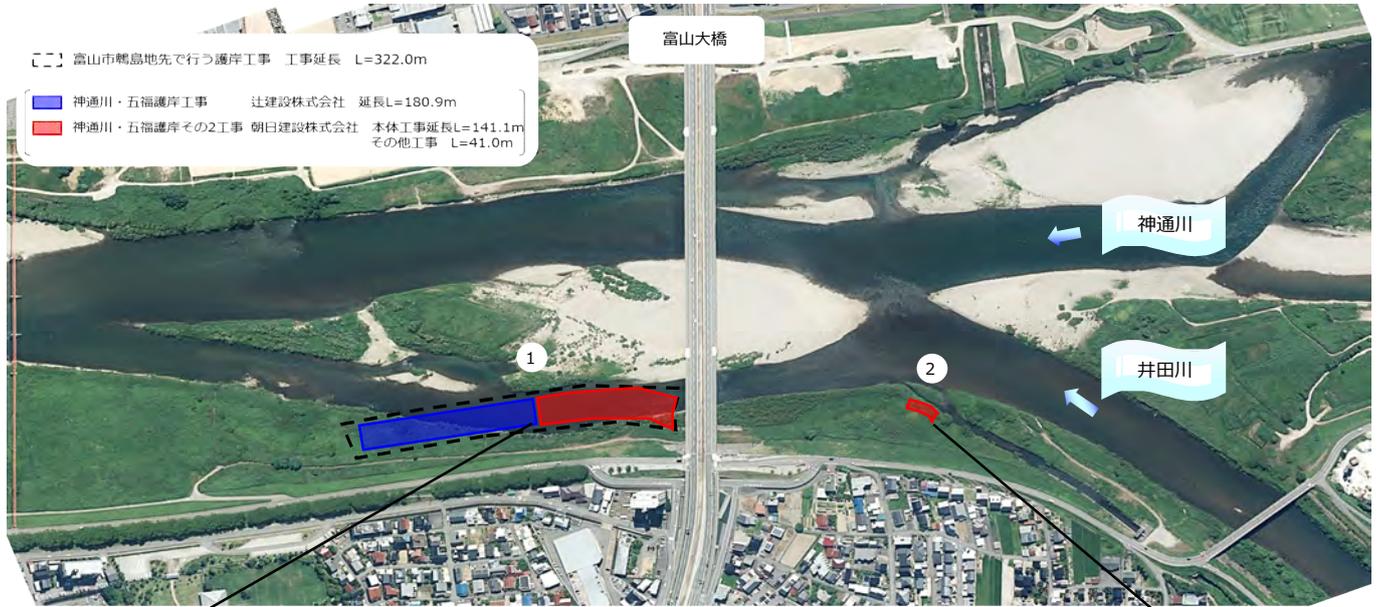

計画工程表	令和4年												令和5年																	
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
準備・片付け	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21
河川土工																														
基礎工																														
護岸工																														
根固め工																														
仮設工																														

**出水期間**  
9月までは、別の場所で、根固め工に使用するコンクリートブロックの制作をしています

**非出水期間**  
10月から河川工事箇所による工事を開始します。

**2月28日までに完成**  
※漁業の関係により工期の延長の可能性がありますが

出水期とは集中豪雨（梅雨）、台風等洪水が起きやすい時期をさし、非出水期はこれ以外の期間
