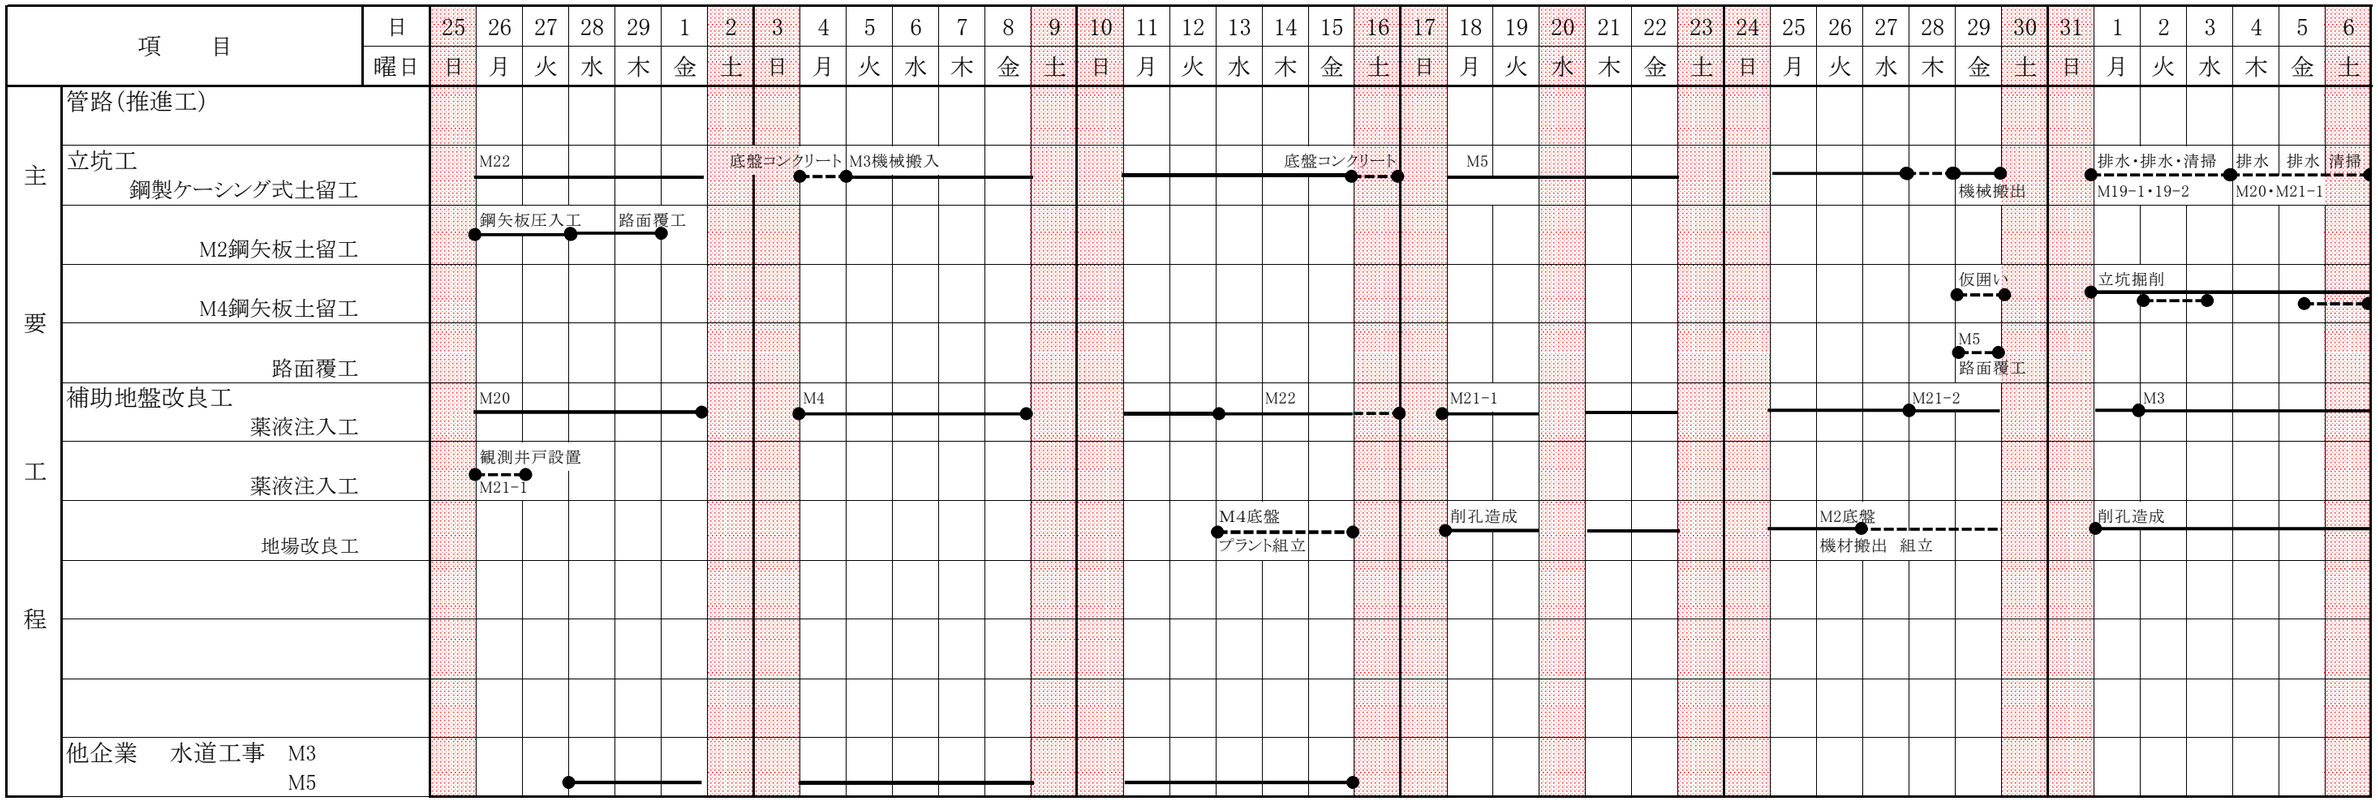
項　目
日
曜日
25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
主要工程
管路(推進工)
立坑工
鋼製ケーシング式土留工
M22
底盤コンクリート
M3機械搬入
底盤コンクリート
M5
機械搬出
排水・排水・清掃
M19-1・19-2
排水
M20・M21-1
排水
清掃
M2鋼矢板土留工
鋼矢板圧入工
路面覆工
M4鋼矢板土留工
仮囲い
立坑掘削
路面覆工
M5
路面覆工
補助地盤改良工
薬液注入工
M20
M4
M22
M21-1
M21-2
M3
薬液注入工
観測井戸設置
M21-1
地場改良工
M4底盤
プラント組立
削孔造成
M2底盤
機材搬出　組立
削孔造成
他企業　水道工事　M3
M5
