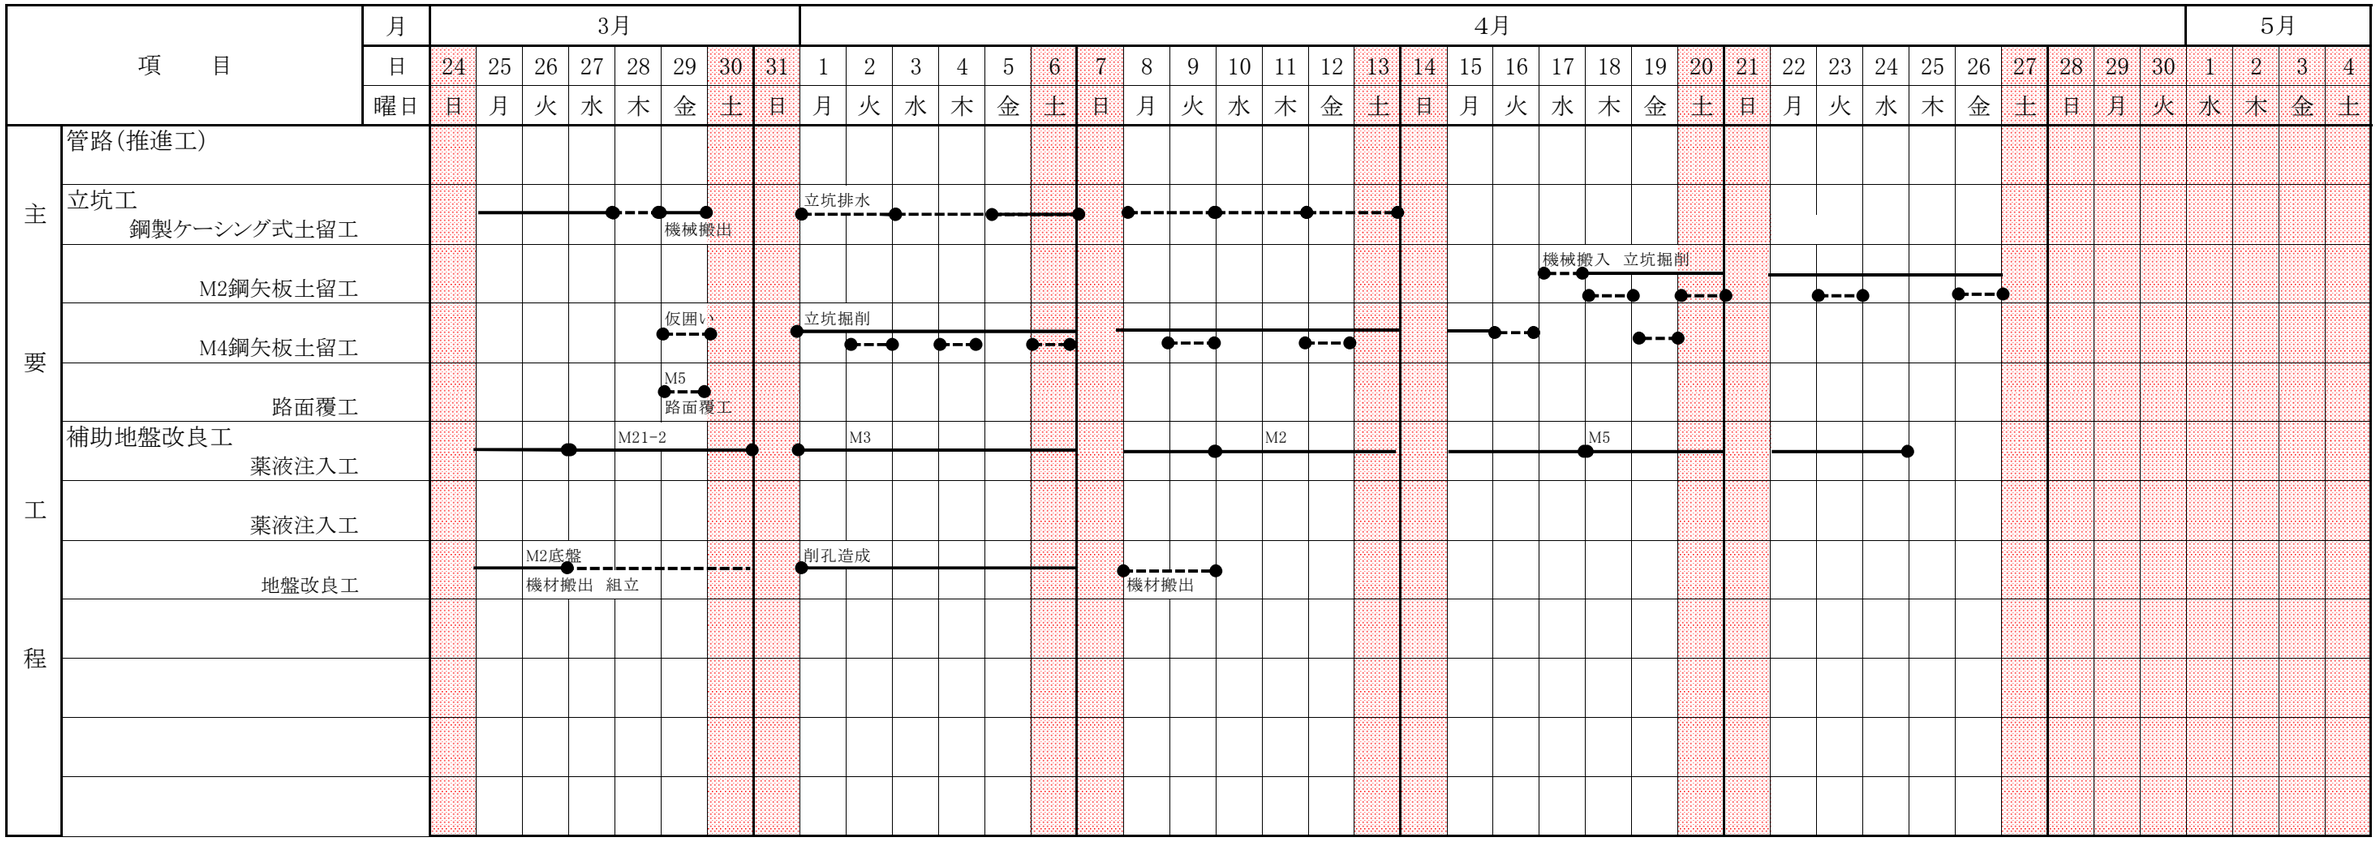
項　目
月
日
曜日
3月
4月
5月
24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
主要工程
管路(推進工)
立坑工
鋼製ケーシング式土留工
立坑排水
機械搬出
M2鋼矢板土留工
機械搬入　立坑掘削
M4鋼矢板土留工
仮囲い
立坑掘削
路面覆工
M5
路面覆工
補助地盤改良工
薬液注入工
M21-2
M3
M2
M5
薬液注入工
地盤改良工
M2底盤
機材搬出　組立
削孔造成
機材搬出
